



## מדריך למשתמש SAP

### מודול PS

# צפייה בדוחות - PS

גרסה 1

29/03/2004

<b>תוכן עניינים</b>
---------------------

<b>3</b>	<b>הקדמה</b>	<b>1</b>
3	כללי ומטרה	1.1
3	סמלים מוסכמים בחוברת	1.2
<b>5</b>	<b>דוחות – במערכת הפרויקט</b>	<b>2</b>
7	סקירת מבנה (CN41)	2.1
9	הזמנות אחזקה המקושרות ל- WBS (CN45N)	2.2
11	תכנון/בפועל/התחייבות/תוכנית נשאר/הוקצה בדולרים (טרנזקציה s_alr_87013533)	2.3
14	בפועל/התחייבות/סיכום/תוכנית במטבע אזור CO (s_alr_87013542)	2.4
16	תקציב/בפועל/התחייבות/תוכנית נשאר/הוקצה בדולרים (s_alr_87013558)	2.5
19	תהליך drill down – מעבר בין מסכים מתוך הדוח	2.5.1
21	פריטי שורה – התחייבויות (CJ15)	2.6
23	הצגת דרישות רכש לפרויקט (ME5J)	2.7
25	תקציב/בפועל/התחייבות/תוכנית נשאר/הוקצה בשקלים (טרנזקציה zpm_ils_budget)	2.8
27	תכנון/בפועל/התחייבות/תוכנית נשאר/הוקצה בשקלים (טרנזקציה zpm_ils_plan)	2.9
29	תקציב / משוחרר / התחייבויות / בפועל – בשקלים (טרנזקציה zpm_ils_rel_bdgt)	2.10

## 1 הקדמה

### 1.1 כללי ומטרה

חברת זו נכתבה במטרה לשמש מדריך לתפעול המערכת הממוחשבת של הטכניון ולהנחות את תהליך הביצוע של פעילויות העבודה השוטפות בעבודה היומיומית במערכת ה-SAP. חברת זו היא מדריך לעבודה בנושא ניהול פרויקטים – מודול ה-PS. על מנת למצוא את הדרך בסביבת ה-SAP ניתן להיעזר במדריך הניווט.

#### הערה!

הפניה בחוברת זה הנה בלשון זכר, אך היא מיועדת לכולם. השימוש בלשון זו, נעשה מטעמי נוחות בלבד!

### 1.2 סמלים מוסכמים בחוברת

#### לאורך החוברת יופיעו מספר סמלים ומוסכמות כתיבה:

1. **תפריטים** מופיעים בגופן מודגש. לציון מעבר בהיררכיה של תפריטים מופיע כותרת התפריט בגופן מודגש ואחריו ← המציין את המעבר לתפריט הבא.
2. **טרנזקציה** (קוד פעולה) תופיע בסוגריים, בסוף מסלול התפריטים.
3. **לחצנים** מופיעים בגופן מודגש ותמונה.
4. **כותרת פרק** מופיעה בגופן מודגש ומוגדל בתוך מסגרת.
5. **כותרת סעיף** בפרק מופיעה בגופן מודגש ומוגדל בתוך מסגרת, אך קטן מכותרת פרק, והיא כוללת את מספר הפרק.
6. **סטאטוס שדה** לשדה במסך 3 מצבי הזנה:
  - **חובה:** יש להזין שדה זה על-מנת להמשיך בתהליך.
  - **רשות:** אפשרי להזין שדה זה, אך אינו מעכב את המשך התהליך. מומלץ להזין כמה שיותר שדות כדי להקל על חיפוש וחיתוך הנתונים בשלב מאוחר יותר.
  - **אוטומטי:** שדות המוזנים על-ידי המערכת לאחר ביצוע פעולה מסוימת. לא להזנת המשתמש.

7. חלקי המסך- בלוקים כאשר המסך מחולק למספר חלקים, כל חלק נקרא 'בלוק'. בהנחיות לפעולה, תופיע הפנייה לבלוק המתאים.

8. סניפי הסבר סניפים שרוצים להדגיש חשיבות של נושא יכולים להיות מסוג "שים לב" או "טיפ" והם מופיעים תמיד במסגרת ובצורה שמובאת להלן.

שים לב - לסימן לב - לפניה נושא בעל חשיבות

טיפ – מידע נוסף או דרך נוספת לבצע את אותה פעולה. **לדוגמא:** כדאי לשמור טרנזקציות שימושיות ברשימת המועדפים. (ראה חוברת ניווט, פרק נתיבים מקוצרים)

9. תזכורת לכללי ניווט בסיסיים:

- לאחר בחירה בתיקייה מבוקשת יש ללחוץ פעמיים ברציפות על התיקייה הנבחרת.
- **לביצוע** - לביצוע הקש על הכפתור או F8 .
- למעבר בהיררכית התפריטים – יופיעו שמות המסכים וחיצים, החיצים מסמלים את המעבר בין המסמכים. לדוגמא - **חשבונאות** ⇐ **חשבונאות פיננסית** ⇐ **ספר ח-נות ראשי** ⇐ **רשומות אב** ⇐ **עיבוד יחיד** ⇐ **בטבלת החשבונות**

ניתן גם על ידי הזנת קוד טרנזקציה רצויה בתיבת ההזנה  ולהקיש Enter או להמשך.

## 2 דוחות – במערכת הפרויקט

במערכת ה-SAP קיימים דוחות רבים ומגוונים, חלק מהדוחות מוצגים כאן לפניך ואת חלקם הגדול תוכל למצוא תחת תיקיית לוגיסטיקה ⇐ מערכת פרויקט ⇐ מערכת מידע....

### חשוב לדעת:

כל הדוחות הסטנדרטיים (המופיעים בעץ התיקיות של ה-sap) מוצגים במטבע דולרי  
 כל הדוחות שפותחו במיוחד עבור הטכניון (אשר מתחילים בקוד – zpm) מוצגים במטבע מקומי – שקל

**שים - ♥**

**הדוחות הנוספים במערכת:**

מבנים

- סקירת מבנה - CN41
- סקירות יחידות
- הגדרות פרויקט - CN42N
- אלמנטי WBS - CN43N
- רשתות - CN46N
- פעילויות - CN47N
- הזמנות - CN45N
- מסמכי הפצה ומכירות - CN54N
- פריטי מסמך מכירות - CN55N
- יחסים - CN49N
- אבני דרך - CN53N
- כלים ומשאבים לייצור - CN51N

פיננסים

- S\_ALR\_87013531 - עלויות/הכנסות/הוצאות/קבלות
- עלויות
- מבוסס תוכנית
- הירארכיה
- S\_ALR\_87013532 - תכנית/בפועל/שונות
- S\_ALR\_87013533 - Plan/Actual/Commitment/Rem.Plan/Assigned
- S\_ALR\_87013534 - תכנית 1/תכנית 2/בפועל/התחייבויות
- S\_ALR\_87013535 - בפועל באזורי CO/אובייקט/טראנסאקציות מטבע
- S\_ALR\_87013536 - תכנית/בפועל/מקדמה כהוצאה
- S\_ALR\_87013537 - פרטי התחייבות
- S\_ALR\_87013538 - השוואת גרסת פרויקט: בפועל/תכנית
- S\_ALR\_87013539 - השוואת גרסת פרויקט: תכנית
- S\_ALR\_87013540 - תחזית
- S\_ALR\_87013541 - ריבית פרויקט: תכנית/בפועל
- S\_ALR\_87100185 - עלויות בפועל עבור כל חודש -שנת כספים שוטפת
- S\_ALR\_87100186 - עלויות מתוכננות עבור כל חודש - שנת כספים שוטפת
- S\_ALR\_87100187 - התחייבויות עבור כל חודש - שנת כספים שוטפת
- S\_ALR\_87100188 - עלויות בפועל נצברו
- S\_ALR\_87100189 - סדרות זמן בפועל/בתכנון
- S\_ALR\_87100190 - תוכנית/בפועל/שונות עבור כל פרויקט ואחראי

לפי סעיף הוצאה

- S\_ALR\_87013542 - בפועל/התחייבות/סיכום/תוכנית במטבע איזור CO
- S\_ALR\_87013543 - בפועל/תוכנית/שונות מוחלט/שונות %
- S\_ALR\_87013544 - בפועל/תוכנית השוואה: תקופות
- S\_ALR\_87013545 - השוואה תקופתית - בפועל
- S\_ALR\_87013546 - התחייבויות: השוואה תקופתית
- S\_ALR\_87013547 - השוואה תקופתית - תכנית
- S\_ALR\_87013548 - נתוני מפתח סטטיסטיים/תקופות
- S\_ALR\_87013549 - בפועל/תוכנית השוואה עם שותף
- S\_ALR\_87013550 - חוב באובייקט/מטבע איזור CO
- S\_ALR\_87013551 - חובות מתוכננים באובייקט/מטבע איזור CO
- S\_ALR\_87013552 - חיוב/זיכוי בפועל
- S\_ALR\_87013553 - חובה/זכות, תכנית
- S\_ALR\_87013554 - השוואה בין 2 גרסאות תכנון
- S\_ALR\_87013555 - תוצאות פרויקט

קשור-תקציב

- S\_ALR\_87013556 - סקירת קרנות
- S\_ALR\_87013557 - תקציב/בפועל/שונות
- S\_ALR\_87013558 - תקציב/בפועל/התחייבות/תוכנית נשאר/הוקצאה
- S\_ALR\_87013559 - תקציב/מבזר/תוכנית/מבזר
- S\_ALR\_87013560 - עדכוני תקציב
- S\_ALR\_87013561 - בקרת זמינות

פריטי שורה

- CJ13 - עלויות בפועל/הכנסות
- CJ15 - התחייבויות
- CJ14 - תוכנית עלויות/הכנסות
- CJ19 - עלות היררכית/תכנון הכנסות
- CJ18 - תקציב
- CJ1A - תשלומים בפועל/התחייבויות תשלופ
- CJ1B - תשלומים מתוכננים
- CJ1F - ניתוח תוצאות
- CJ1D - פריט שור לייחוס

חומר

דרישות רכש

- ME5J - לפרויקט
- ME5K - עבור הקצאת חשבון

הזמנות רכש

- ME2J - לפרויקט
- ME2K - עבור הקצאת חשבון

הם מציגים את הנתונים במטבע אזור הבקרה: דולר, אבל ניתן להעתיק אותם ולשנות, כך שיציגו בשקלים.

מועדפים


- ZPM\_ILS\_PLAN - תכנון / בפועל / התחייבויות - בשקלים
- ZPM\_ILS\_BUDGET - תקציב / בפועל / התחייבויות - בשקלים
- ZPM\_ILS\_REL\_BDGT - תקציב / משוחרר / התחייבויות / בפועל - בשקלים

אלו הדוחות שפותחו במיוחד עבור הטכניון (אשר מתחילים בקוד – zpm) ומוצגים במטבע מקומי – שקל

**2.1 סקירת מבנה (CN41)**

1. פתח את התיקיות הבאות:

לוגיסטיקה ← מערכת פרויקט ← מערכת מידע ← מבנים ← סקירת מבנה (CN41)  
 יתקבל המסך הבא:

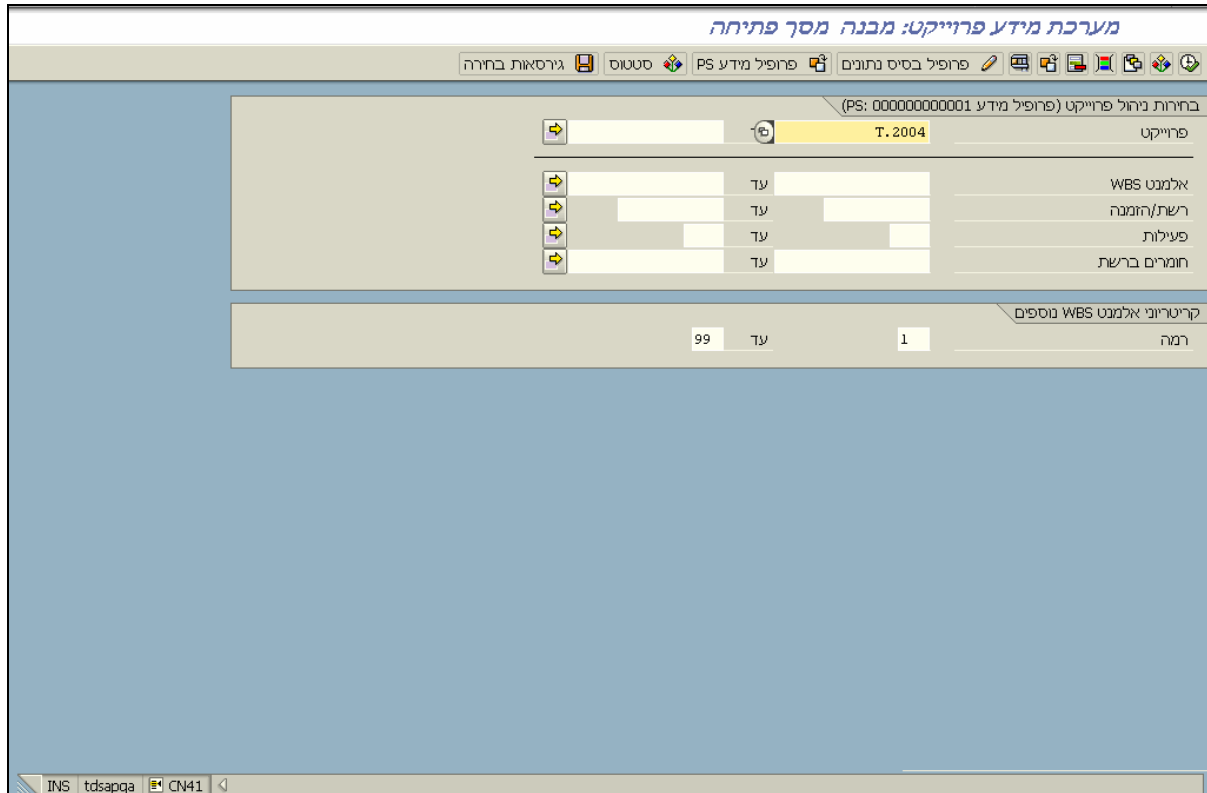



2. התייחס לשדות הבאים:

שדה	סטטוס	הסבר
פרויקט	חובה	הזן / בחר מתוך רשימת חיפוש
אלמנט WBS	רשות	הזן / בחר מתוך רשימת חיפוש את הגרסה הרצויה

 3. לחץ על  פרופיל מידע PS

יתקבל החלון הבא:


 4. וודא כי מוזן הפרופיל TECH001 ולחץ על  לאישור



5. להפקת הדוח הקש F8 או לחץ על

יתקבל המסך הבא:

**מערכת מידע פרוייקט: מבנה סקירה**

אוברייקט פרוייקט מספר: 83

משתמש 20	אחראי	תקציב	עלויות בפועל	סה"כ התחייב. עלות	אוברייקט פרוייקט	אוברייקט פרוייקט
		USD 0.00	USD 86.18	USD 4,201.98	T.2004	תקציב יחידות -403
		USD 0.00	USD 86.18	USD 4,201.98	T.2004	תקציב יחידות - 403
		USD 0.00	USD 0.00	USD 285.90	T.2004.2010	הנדסה אזרחית -403
		USD 0.00	USD 0.00	USD 285.90	20000672	התקנת 2 ניקודות תקשורת במטב
		USD 0.00	USD 0.00	USD 0.00	0010 20000672	התקנת 2 ניקודות תקשורת במ
		USD 0.00	USD 0.00	USD 0.00	20000886	עבודת סיוד
		USD 0.00	USD 0.00	USD 0.00	0010 20000886	עבודת סיוד
		USD 0.00	USD 16.57	USD 0.00	T.2004.2020	ארכיוטקורה -403
		USD 0.00	USD 16.57	USD 0.00	20000885	הכנת תשתית הזנה לגלאי
		USD 0.00	USD 0.00	USD 0.00	0010 20000885	הכנת תשתית הזנה לגלאי
		USD 0.00	USD 0.00	USD 0.00	0010 20000885	כבל ט.ב.ט. טרומפולסטי 3
		USD 0.00	USD 0.00	USD 0.00	0010 20000885	קופסת זיווד מפלסטיק:80#
		USD 0.00	USD 0.00	USD 0.00	0010 20000885	צנור פלסטי מריכף חסין א
		USD 0.00	USD 0.00	USD 0.00	T.2004.2030	הנדסת מכונות -403
		USD 0.00	USD 0.00	USD 0.00	T.2004.2040	זומרים -403
		USD 0.00	USD 0.00	USD 0.00	20000707	קפיצים לחלונות
		USD 0.00	USD 0.00	USD 0.00	0010 20000707	קפיצים לחלונות
		USD 0.00	USD 69.61	USD 2,216.32	T.2004.2050	השמל -403
		USD 0.00	USD 0.00	USD 1,174.68	20000744	התקנת מזגנים
		USD 0.00	USD 0.00	USD 0.00	0010 20000744	התקנת מזגנים פיישבן-חדר עי
		USD 0.00	USD 69.61	USD 0.00	20000844	תיקון מערכת השמל
		USD 0.00	USD 0.00	USD 0.00	0010 20000844	תיקון מערכת השמל
		USD 0.00	USD 0.00	USD 0.00	0010 20000844	השגק צוק לפלורוסנט 65
		USD 0.00	USD 0.00	USD 0.00	0010 20000844	מפסק זרם פחת 4 מגעים 40
		USD 0.00	USD 0.00	USD 0.00	0010 20000844	מפסק בקליט עה"ט חילוף
		USD 0.00	USD 0.00	USD 0.00	0010 20000844	שקע כח תחת הטיח (ציתור)
		USD 0.00	USD 0.00	USD 0.00	0010 20000844	כחסה 70 מ"מ פלסטי עגול
		USD 0.00	USD 0.00	USD 0.00	0010 20000844	כחסה 55 מ"מ פלסטי עגול
		USD 0.00	USD 0.00	USD 0.00	0010 20000844	שקע כח על הטיח טפוס אנג
		USD 0.00	USD 0.00	USD 0.00	0010 20000844	כבל ט.ב.ט. טרומפולסטי 3

במסך זה ניתן לצפות במבנה הפרויקט והחלוקה לרמות השונות.



כמו כן ניתן להוסיף עמודות מידע על ידי לחיצה על


ממסך זה ניתן לבצע תהליך drill down לתוך אלמנט ה-WBS או הזמנת האחזקה, על ידי לחיצה כפולה על השורה המבוקשת.



**2.2 הזמנות אחזקה המקושרות ל- WBS (CN45N)**


1. פתח את התיקיות הבאות:

לוגיסטיקה ← מערכת פרויקט ← מערכת מידע ← מבנים ← סקירת יחידות ← הזמנות (CN45N)  
 יתקבל המסך הבא:

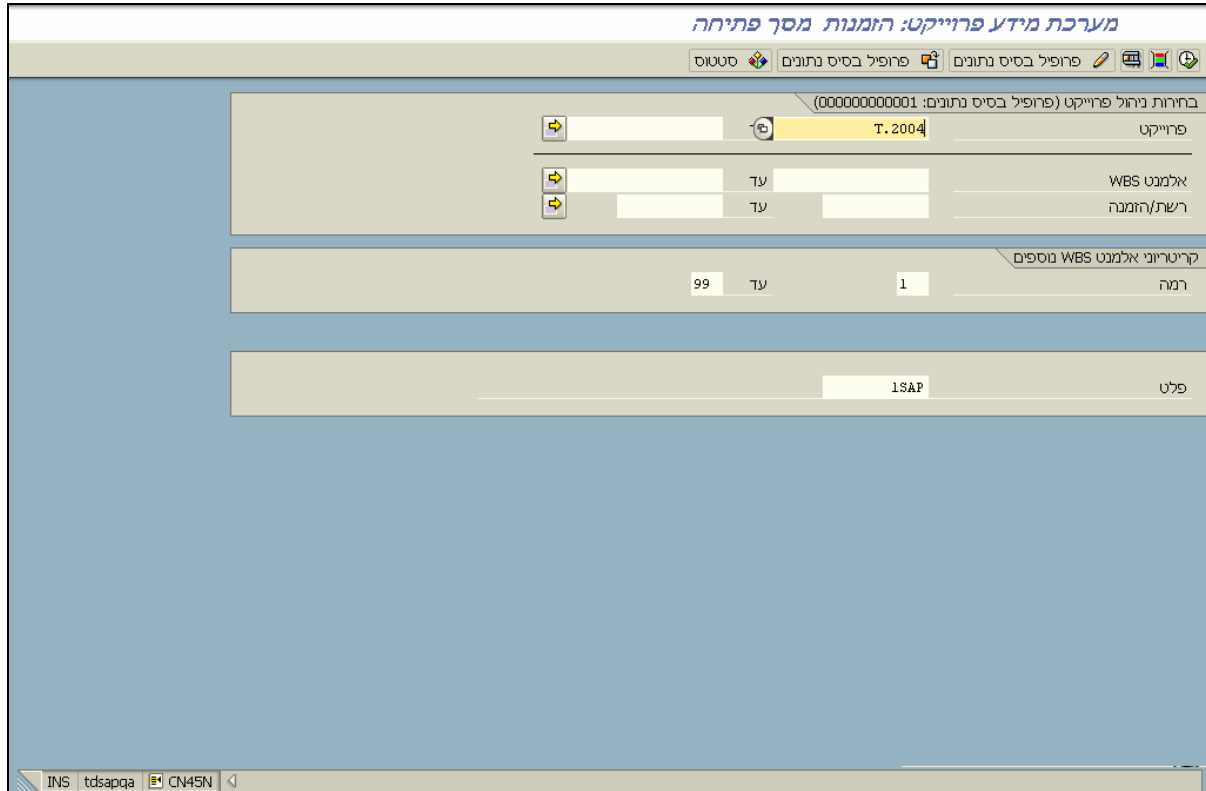



6. התייחס לשדות הבאים:

שדה	סטאטוס	הסבר
פרויקט	חובה	הזן / בחר מתוך רשימת חיפוש
אלמנט WBS	רשות	הזן / בחר מתוך רשימת חיפוש את הגרסה הרצויה

7. לחץ על  פרופיל בסיס נתונים

יתקבל החלון הבא:



8. וודא כי מוזן הפרופיל 00000000001 ולחץ על  לאישור



9. להפקת הדוח הקש F8 או לחץ על

יתקבל המסך הבא:

*מערכת מידע פרוייקט: הזמנות סקירה*

מחיקה	התחלה בס.	סיום בסיסי	אתר	סוג הזמנה	אלמנט WBS	הגדרת פרוייקט	טקסט קצר	הזמנה
	12.02.2004	12.02.2004	3000	ZT02	T.2004.2010	T.2004	התקנת 2 ניקודות תקשורת במטבח, קו...	20000672
	23.02.2004	23.02.2004	3000	ZT02	T.2004.2010	T.2004	עבודת סיד	20000886
	23.02.2004	23.02.2004	3000	ZT02	T.2004.2020	T.2004	הכנת תשתית הזנה לגלאי	20000885
	11.02.2004	11.02.2004	3000	ZT02	T.2004.2040	T.2004	קפיצים לחלונות	20000707
	17.02.2004	17.02.2004	3000	ZT02	T.2004.2050	T.2004	התקנת מזגנים	20000744
	26.02.2004	26.02.2004	3000	ZT02	T.2004.2050	T.2004	תיקון מערכת חשמל	20000844
	23.02.2004	23.02.2004	3000	ZT02	T.2004.2050	T.2004	ריפוד כסאות	20000887
	03.03.2004	03.03.2004	3000	ZT02	T.2004.2050	T.2004	לוח מחיק	20000888
	03.03.2004	03.03.2004	3000	ZT02	T.2004.2050	T.2004	וילונות ישחורים	20000908
	03.03.2004	03.03.2004	3000	ZT02	T.2004.2050	T.2004	תשתית חשמל	20000953
	11.02.2004	11.02.2004	3000	ZT02	T.2004.2100	T.2004	התקנת 2 נק' תקשורת בחדר אחראי ל...	20000682
	10.02.2004	10.02.2004	3000	ZT02	T.2004.2130	T.2004	מתקן לאחסון כבלים	20000708
	26.02.2004	26.02.2004	3000	ZT02	T.2004.2320	T.2004	התקנת נקודת תקשורת אחת בחדר 21...	20000847
	29.02.2004	29.02.2004	3000	ZT02	T.2004.2340	T.2004	חשמל	20000852


ממסך זה ניתן לבצע תהליך drill down לתוך הזמנת האחזקה על ידי לחיצה כפולה על השורה המבוקשת.

**2.3 תכנון/בפועל/התחייבות/תוכנית נשאר/הוקצה בדולרים (טרנזקציה s\_alr\_87013533)**

1. פתח את התיקיות הבאות:

לוגיסטיקה ⇨ מערכת פרויקט ⇨ מערכת מידע ⇨ פיננסים ⇨ עלויות ⇨ מבוסס תוכנית ⇨ הירארכיה ⇨  
 תכנון/בפועל/התחייבות/תוכנית נשאר/הוקצה בדולרים (Plan/Actual/Commitment/Rem.Plan)  
 (טרנזקציה S\_ALR\_87013533)

יתקבל החלון הבא:




2. התייחס לשדות הבאים:

שדה	סטטוס	הסבר
אזור בקרה	חובה	הזן / בחר מתוך רשימת חיפוש (טכניון / מוסד)


 3. הקש Enter או לחץ על  להמשך. [לחיצה על שמירה – תמנע צורך בבחירה בפעמים הבאות].

יתקבל החלון הבא:










4. התייחס לשדות הבאים:

שדה	סטטוס	הסבר
פרופיל בסיס נתונים	חובה	הזן / בחר מתוך רשימת חיפוש (טכניון / מוסד)

5. הקש Enter או לחץ על  להמשך.  
יתקבל המסך הבא:

בחירה: Plan/Actual/Commitment/Rem.Plan/Assigned

סטטוס  פחפיל בסיס נתונים  פחפיל בסיס נתונים     

בחרות ניהול פרויקט (פחפיל בסיס נתונים: 000000000001)

פרויקט T. 2004

אלמנט WBS

רשת/הזמנה

פעילות

חומרים ברשת

בחרות ד"ח

גירסת תכנון PS-גירסת תכנון ישוטי בשקל III

סוג פלט

ד"ח גרפי-פלט

דיווח לפי רמות קלאסי

INS tdsapap2 S\_ALR\_87013533

6. התייחס לשדות הבאים:

שדה	סטטוס	הסבר
פרויקט	חובה	הזן / בחר מתוך רשימת חיפוש
גרסת תכנון	רשות	הזן / בחר מתוך רשימת חיפוש את הגרסה הרצויה
סוג פלט	רשות	סמן – "דוח לפי רמות קלאסי"



7. להפקת הדוח הקש F8 או לחץ על

יתקבל המסך הבא:

**ביצוע Plan/Actual/Commitment/Rem.Plan/Assigned :סקירה**

פורמט מספרים...

Z נתונים נוכחיים 04.03.2004

Plan/Actual/Commitment/Rem.Plan/Assigned

סיור

- תקופה/שנה
- הגדרת פרויקט
- קטגוריית ערך
- סוג אובייקט

ערכים כוללים						אובייקט
זמין	מוקצה	תכ.הזמנות	התחייבות	בפועל	תכנון	
4,607-	4,607	0	4,202	405	0	תקציב יחידות -403 פר. T.2004
4,607-	4,607	0	4,202	405	0	WBS T.2004.403 - תקציב יחידות -403
286-	286	0	286	0	0	WBS T.2004.2010 - הנדסה אוזרחית -403
17-	17	0	0	17	0	ORD 20000672 - התקנת 2 ניקודות תקשור
17-	17	0	0	17	0	WBS T.2004.2020 - ארכיטקטורה -403
2,605-	2,605	0	2,216	388	0	ORD 20000885 - הכנת תשתית הזנה לגלא
1,175-	1,175	0	1,175	0	0	WBS T.2004.2050 - חשמל -403
70-	70	0	0	70	0	ORD 20000744 - התקנת מזגנים
842-	842	0	842	0	0	ORD 20000844 - תיקון מערכת חשמל
200-	200	0	200	0	0	ORD 20000888 - לוח מחיק
319-	319	0	0	319	0	ORD 20000908 - וילונות שחורים
451-	451	0	451	0	0	ORD 20000953 - תשתית חשמל
451-	451	0	451	0	0	WBS T.2004.2100 - מתמטיקה -403
1,111-	1,111	0	1,111	0	0	ORD 20000682 - התקנת 2 נק' תקשורת ב
1,111-	1,111	0	1,111	0	0	WBS T.2004.2130 - מרכז המחשבים -403
138-	138	0	138	0	0	ORD 20000708 - מתקן לאיסוס כבלים
138-	138	0	138	0	0	WBS T.2004.2320 - מצב המוצק -403
4,607-	4,607	0	4,202	405	0	ORD 20000847 - התקנת נקודות תקשורת א

תוצאה

INS tdsapap2 S\_ALR\_87013533

בדוח ניתן לראות את:

- התכנון (לגרסה שנבחרה)
- העלויות בפועל
- התחייבויות
- תכנון הזמנות
- תקציב מוקצה (בפועל + התחייבויות + תכנון הזמנות)
- תקציב זמין (תקציב – מוקצה).


**2.4 בפועל/התחייבות/סיכום/תוכנית במטבע אזור CO (s\_alr\_87013542)**

1. פתח את התיקיות הבאות:

לוגיסטיקה ← מערכת פרויקט ← מערכת מידע ← פיננסים ← עלויות ← מבוסס תכנית ← לפי סעיף

הוצאה ← בפועל/התחייבות/סיכום/תוכנית במטבע אזור CO (s\_alr\_87013542)

יתקבל המסך הבא:

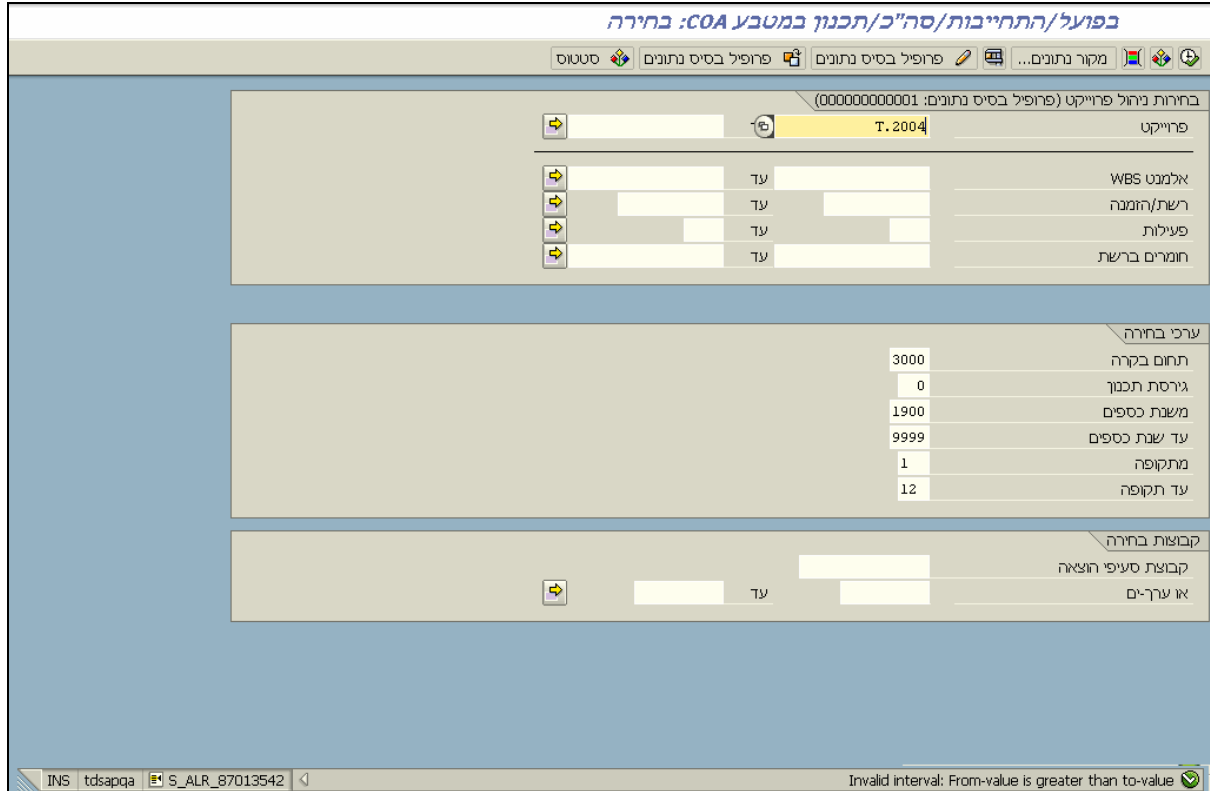

בפועל/התחייבות/סיכום/תוכנית במטבע COA: בחירה  
 מקור נתונים... פופיל בסיס נתונים פופיל בסיס נתונים סטטוס

בחירות ניהול פרויקט (פופיל בסיס נתונים: 000000000001) T.2004 פרויקט

עד	עד	עד	עד	אלמנט WBS
עד	עד	עד	עד	רשת/הזמנה
עד	עד	עד	עד	פעילות
עד	עד	עד	עד	חומרים ברשת

ערכי בחירה

3000	תחום בקרה
0	גירסת תכנון
1900	משנת כספים
9999	עד שנת כספים
1	מתקופה
12	עד תקופה

קבוצות בחירה  
 קבוצת סעיפי הוצאה או ערך-ים

INS tdsapqa S\_ALR\_87013542 Invalid interval: From-value is greater than to-value

2. התייחס לשדות הבאים:

הסבר	סטטוס	שדה
הזן / בחר מתוך רשימת חיפוש	חובה	פרויקט
הזן / בחר מתוך רשימת חיפוש את הגרסה הרצויה	רשות	גרסת תכנון



3. להפקת הדוח הקש F8 או לחץ על

יתקבל המסך הבא:

בפועל/התחייב/סך/תכנון

השמות: אבייקט

פר. T.2004 תקציבי יחידות-403

WBS T.2004 תקציבי יחידות - ק

WBS T.2004.2010 הנדסה א

ORD 20000672 התקנת ?

WBS T.2004.2020 ארכיטקט

ORD 20000885 הכנת ת/

WBS T.2004.2050 חשמל-3

ORD 20000744 התקנת נ

ORD 20000844 תיקון מע

ORD 20000888 לוח מחיק

ORD 20000908 וילומות ש

ORD 20000953 תשתית ו

WBS T.2004.2100 מתמטיקה

ORD 20000682 התקנת ?

WBS T.2004.2130 מרכז המו

ORD 20000708 מתקן ל

WBS T.2004.2320 מצב המו

ORD 20000847 התקנת נ

תכנון	סה"כ	התחייבויות	בפועל	סעיפי הוצאה
.203	199.91	199.91		500303 ריהוט
.505	86.18		86.18	500403 תחזוקה יזומה
.1,984	1,952.94	1,952.94		500901 קבלו בנין
.1,185	1,174.68	1,174.68		500903 קבלו מיזוג אויר
.887	874.45	874.45		500908 תקשורת
<b>.4,766</b>	<b>4,288.16</b>	<b>4,201.98</b>	<b>86.18</b>	<b>* כל סעיפי הוצאה</b>

29.03.2004 DORITEF

INS tdsapqa S\_ALR\_87013542

בדוח ניתן לראות את:

- התכנון (לגרסה שנבחרה)
- העלויות בפועל
- התחייבויות
- לפי חלוקה לסעיפי הוצאה


**2.5 תקציב/בפועל/התחייבות/תוכנית נשאר/הוקצה בדולרים (s\_alr\_87013558)**

1. פתח את התיקיות הבאות:

לוגיסטיקה ⇨ מערכת פרויקט ⇨ מערכת מידע ⇨ פיננסים ⇨ עלויות ⇨ קשור-תקציב ⇨


תקציב/בפועל/התחייבות/תוכנית נשאר/הוקצה בדולרים (S\_ALR\_87013558)

יתקבל החלון הבא:




2. התייחס לשדות הבאים:

שדה	סטטוס	הסבר
אזור בקרה	חובה	הזן / בחר מתוך רשימת חיפוש את הקוד המתאים: טכניון / מוסד

3. הקש Enter או לחץ על  להמשך. [לחיצה על שמירה – תמנע צורך בבחירה בפעמים הבאות].


יתקבל החלון הבא:



4. התייחס לשדות הבאים:

שדה	סטטוס	הסבר
פרופיל בסיס נתונים	חובה	הזן / בחר מתוך רשימת חיפוש את הפרופיל הרצוי



5. הקש Enter או לחץ על  להמשך.  
יתקבל המסך הבא:

בחירה: תקציב/בפועל/התחייבות/תכנון נותר/הוקצה

פחפיל בסיס נתונים פחפיל בסיס נתונים סטטוס

בחרות ניהול פרויקט (פחפיל בסיס נתונים: 000000000001)

פרויקט

אלמנט WBS

רשת/הזמנה

פעילות

חומרים ברשת

בחרות ד"ח

גירסת תכנון 0 גרסה פעילה טכניון ומוסד

סוג פלט

ד"ח גרפי-פלט

דיווח לפי רמות קלאסי

INS tdsapap2 S\_ALR\_87013558

6. התייחס לשדות הבאים:

שדה	סטאטוס	הסבר
פרויקט	חובה	הזן / בחר מתוך רשימת חיפוש
גרסת תכנון	רשות	הזן / בחר מתוך רשימת חיפוש את הגרסה הרצויה
סוג פלט	רשות	סמן – "דוח לפי רמות קלאסי"



7. להפקת הדוח הקש F8 או לחץ על

יתקבל המסך הבא:

**ביצוע תקציב/בפועל/התחייבות/תכנון נותר/הוקצה: סקירה**

פורמט מספרים...

תקציב/בפועל/התחייבות/תכנון נותר/הוקצה

ג'רסת תכנון IL1 PS-גרסת תכנון שוטף בשקל

סיור

קטגוריית ערך  
תקופה/שנה  
מטבע תנועה  
תנועה עיסקית

סה"כ שנים						אובייקט
זמין	מוקצה	תכ.חומ.נות	התחייבות	בפועל	תקציב	
4,607-	4,607	0	4,202	405	0	פר. T.2004 תקציבי יחידות -403
4,607-	4,607	0	4,202	405	0	WBS T.2004 תקציבי יחידות - 403
286-	286	0	286	0	0	WBS T.2004.2010 הנדסה אזרחית -403
286-	286	0	286	0	0	ORD 20000672 התקנת 2 ניקודות תקשור
17-	17	0	0	17	0	WBS T.2004.2020 ארכיטקטורה -403
17-	17	0	0	17	0	ORD 20000885 הכנת תשתית הזנה לגלא
2,605-	2,605	0	2,216	388	0	WBS T.2004.2050 חשמל -403
1,175-	1,175	0	1,175	0	0	ORD 20000744 התקנת מוגנים
70-	70	0	0	70	0	ORD 20000844 תיקון מערכת חשמל
842-	842	0	842	0	0	ORD 20000888 לוח מחיק
200-	200	0	200	0	0	ORD 20000908 וילונות שחורים
319-	319	0	0	319	0	ORD 20000953 תשתית חשמל
451-	451	0	451	0	0	WBS T.2004.2100 מתמטיקה -403
451-	451	0	451	0	0	ORD 20000682 התקנת 2 נק' תקשורת ב
1,111-	1,111	0	1,111	0	0	WBS T.2004.2130 מרכז המחשבים -403
1,111-	1,111	0	1,111	0	0	ORD 20000708 מתקן לאיסוף כבלים
138-	138	0	138	0	0	WBS T.2004.2320 מצב המוצק -403
138-	138	0	138	0	0	ORD 20000847 התקנת נקודת תקשורת א
4,607-	4,607	0	4,202	405	0	תוצאה

INS tdsapap2 S\_ALR\_87013558

בדוח ניתן לראות את:


- התקציב השוטף
- עלויות בפועל (הזמנות רכש, חומרים ושירותים) שדווח בהם קבלה, ניפוקי חומר מהמחסן).
- התחייבויות (דרישות והזמנות רכש פתוחות)
- תכנון הזמנות (מכיל תכנון שעות עבודה בתעריף שעה, ותכנון דרישות רכש שלא נוצרו)
- התקציב המוקצה (בפועל + התחייבויות + תכנון הזמנות)
- התקציב הזמין (תקציב – מוקצה)

## 2.5.1 תהליך drill down – מעבר בין מסכים מתוך הדוח

בדוחות אלו ניתן לבצע תהליך drill down - כלומר, ניתן דרך הדוח להגיע למסמכי הרכש והחיוב השונים לדוגמא:

1. לחיצה על "ייבוא דוח" -

תפתח את החלון הבא:

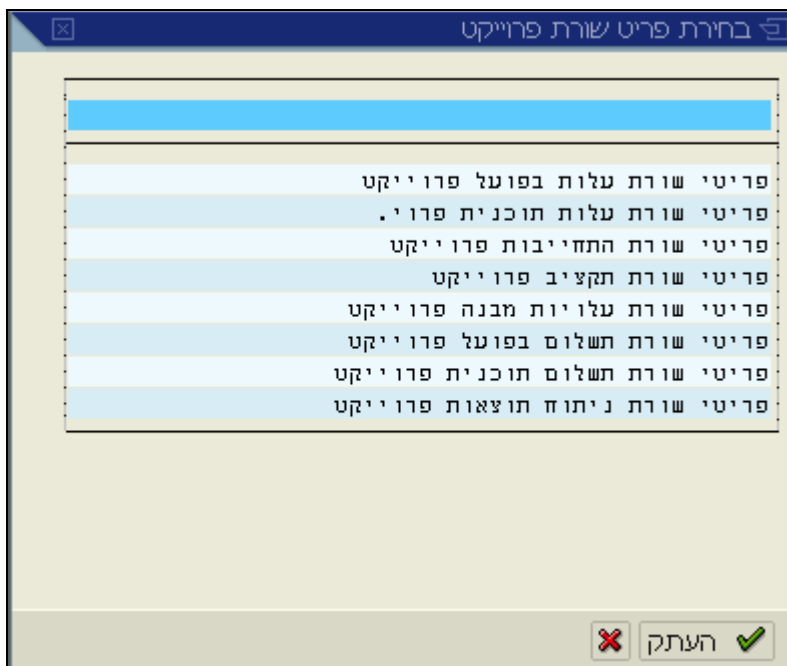

על ידי סימון השורה הרצויה [למשל - פריטי שורת התחייבות פרויקט] ולחיצה על  העתק, ניתן להגיע למסך הבא:

**הצגת שורות התחייבות עבור פרויקטים**

מערך אובייקט תאריך חיוב  
15AP/ פר. 2004 \*  
תקציבי יחידות -403 \*  
עד \*

סוג	פר.ס.	מס.מסמ.אס.	מס.מסמ.אס.	UM	כמות כללת	מט.ערך בק.	ערך מט.אב	סעיף הוצאה	אובייקט	ס.א.	תאריך חיוב
10		1600000155		AU	1	285.90	1,279.12	500908	20000672	ORD	12.02.2004
				<b>AU 1</b>		<b>- 285.90</b>	<b>1,279.12</b>		20000672		
10		1600000181		AU	0	0.00	0.00	500908	20000682	ORD	11.02.2004
				<b>AU 0</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		20000682		
10		1600000180		AU	0	0.00	0.00	500901	20000708	ORD	10.02.2004
				<b>AU 0</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		20000708		
10		1600000168		AU	1	1,174.68	5,215.60	500903	20000744	ORD	17.02.2004
				<b>AU 1</b>		<b>1,174.68</b>	<b>5,215.60</b>		20000744		
10		1600000204		AU	1	137.98	615.37	500908	20000847	ORD	26.02.2004
				<b>AU 1</b>		<b>137.98</b>	<b>615.37</b>		20000847		
10		1600000272		AU	1	841.73	3,776.00	500901	20000888	ORD	03.03.2004
				<b>AU 1</b>		<b>841.73</b>	<b>3,776.00</b>		20000888		
10		1600000265		AU	1	199.91	896.80	500303	20000908	ORD	03.03.2004
				<b>AU 1</b>		<b>199.91</b>	<b>896.80</b>		20000908		
				<b>AU 5</b>		<b>2,640.20</b>	<b>11,782.89</b>				
P 10		6100000049		AU	1	450.57	2,009.54	500908	20000682	ORD	11.02.2004
				<b>AU 1</b>		<b>450.57</b>	<b>2,009.54</b>		20000682		
P 10		6100000051		AU	1	1,111.21	4,956.00	500901	20000708	ORD	10.02.2004
				<b>AU 1</b>		<b>1,111.21</b>	<b>4,956.00</b>		20000708		
				<b>AU 2</b>		<b>1,561.78</b>	<b>6,965.54</b>				
				<b>AU 7</b>		<b>4,201.98</b>	<b>18,748.43</b>				

ממסך זה, ניתן להגיע להצגת דרישת הרכש / הזמנת הרכש שבוצעו עבור הפרויקט, על ידי לחיצה כפולה על מספר הזמנת האחזקה הרצוי.

2. כמו כן, ניתן להגיע לדוח זה ישירות על ידי סימון הסכום אשר עבורו רוצים פירוט, במסך הראשי:

התחייבות
ILS 1
18,748
18,748
1,279
1,279


ואז לחיצה על "יבוא דוח" - והמערכת תציג את הדוח המתאים.

3. לחיצה כפולה על **קטגוריית ערך** תוביל אותך למסך של פירוט לפי סעיפי הוצאה:

שנים קודמות						סה"כ שנים					
זמין	מוקצה	תכ.הזמ.נו.	התחייבות	בפועל	תקציב	זמין	מוקצה	תכ.הזמ.נו.	התחייבות	בפועל	תקציב
0	0	0	0	0	0	200-	200	0	200	0	0
0	0	0	0	0	0	1,953-	1,953	0	1,953	0	0
0	0	0	0	0	0	1,175-	1,175	0	1,175	0	0
0	0	0	0	0	0	874-	874	0	874	0	0
0	0	0	0	0	0	564-	564	478	0	86	0
0	0	0	0	0	0	4,766-	4,766	478	4,202	86	0

1. פתח את התיקיות הבאות:


לוגיסטיקה ← מערכת פרויקט ← מערכת מידע ← פיננסים ← פריטי שורה ← התחייבויות (CJ15)  
 יתקבל המסך הבא:

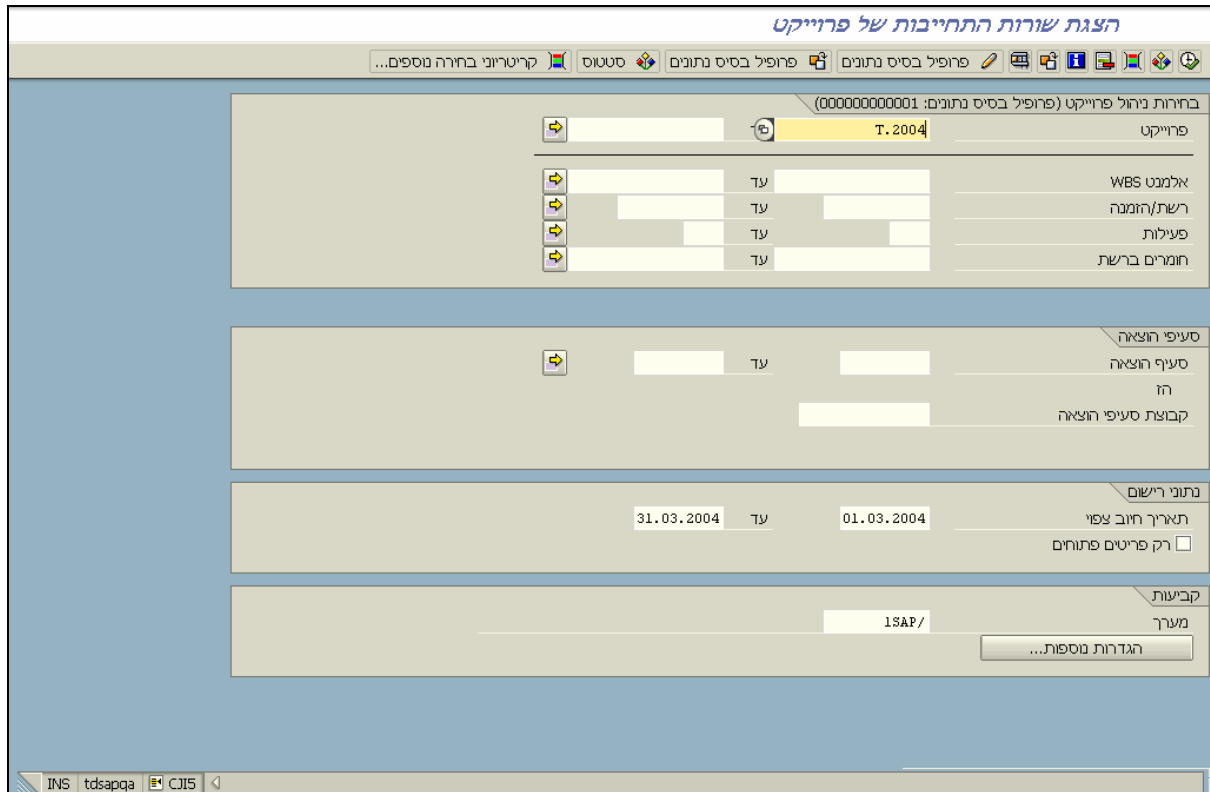

2. התייחס לשדות הבאים:

שדה	סטטוס	הסבר
פרויקט	חובה	הזן / בחר מתוך רשימת חיפוש
תאריך חיוב צפוי	רשות	השורות שיוצגו יהיו רק מתוך טווח התאריכים הרשום

הזן קריטריונים נוספים לפי הצורך

3. להפקת הדוח הקש F8 או לחץ על  יתקבל המסך הבא:

**הצגת שורות התחייבות עבור פרויקטים**

מסך  
אובייקט  
תאריך חיוב

403- תקציבי יחידות - 31.03.2004

1SAP/  
פר. 2004  
עד 01.03.2004

סוג	פר.ס.	מס.מסמ.אס.	UM	כמות סוללת	מט.ערך בק.	ערך מט.אוב	סעיף הוצאה	אובייקט	ס.א.	תאריך חיוב
10		1600000272	AU	1	841.73	3,776.00	500901	20000888	ORD	03.03.2004
			<b>AU 1</b>		<b>841.73</b>	<b>3,776.00</b>		20000888		
10		1600000265	AU	1	199.91	896.80	500303	20000908	ORD	03.03.2004
			<b>AU 1</b>		<b>199.91</b>	<b>896.80</b>		20000908		
			<b>AU 2</b>		<b>1,041.64</b>	<b>4,672.80</b>				
			<b>AU 2</b>		<b>1,041.64</b>	<b>4,672.80</b>				

INS tdsapqqa CJ15

ממסך זה ניתן לבצע תהליך drill down לתוך דרישות הרכש על ידי לחיצה כפולה על השורה המבוקשת.

שיים - ♥


ישנם שני דוחות נוספים הדומים לדוח הנ"ל ומציגים:

- הצגת שורות של עלויות בפועל / הכנסות לפרויקט בטרנזקציה – CJ13
- הצגת שורות תקציב לפרויקט בטרנזקציה – CJ18

**2.7 הצגת דרישות רכש לפרויקט (ME5J)**

1. פתח את התיקיות הבאות:

לוגיסטיקה ← מערכת פרויקט ← מערכת מידע ← חומר ← דרישות רכש ← לפרויקט (ME5J)  
 יתקבל המסך הבא:

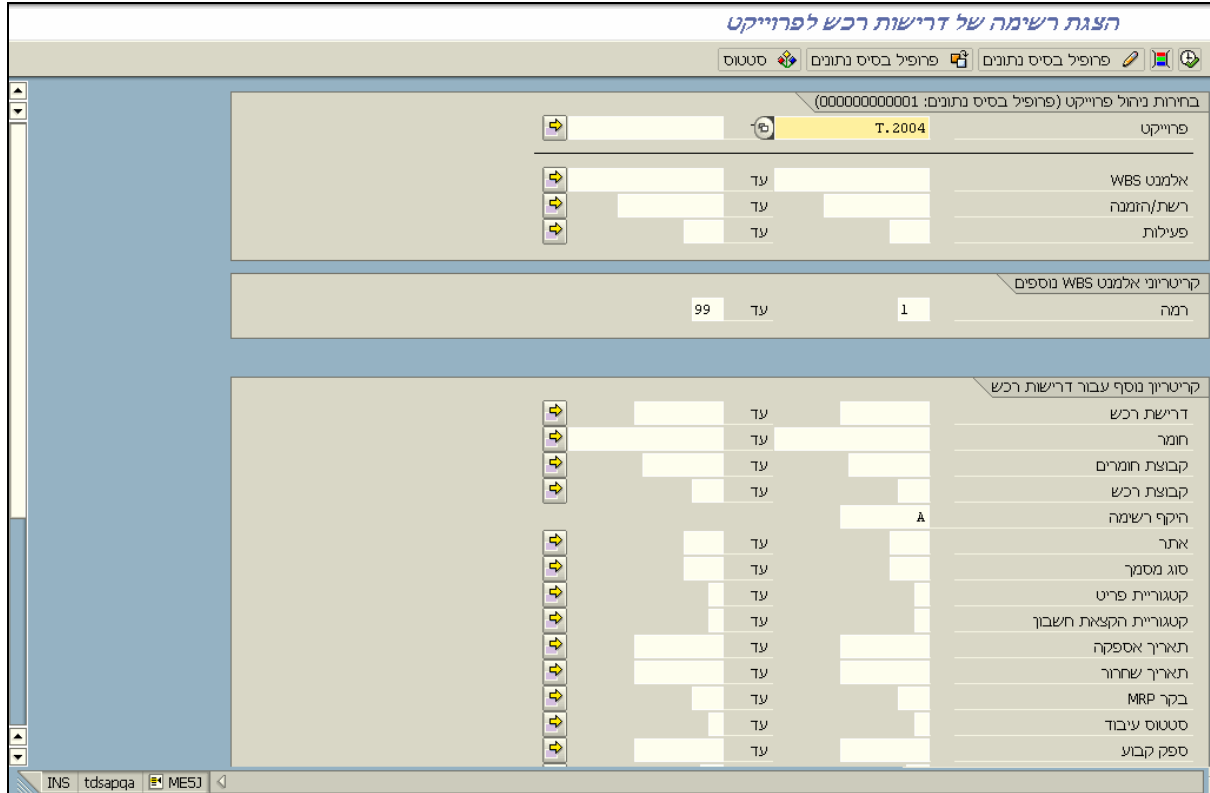

2. התייחס לשדות הבאים:

הסבר	סטטוס	שדה
הזן / בחר מתוך רשימת חיפוש	חובה	פרויקט

הזן קריטריונים נוספים לפי הצורך



3. להפקת הדוח הקש F8 או לחץ על

יתקבל המסך הבא:

**הזמנה: דרישות רכש מוקצות**

הקצאה אוטומטית | הקצאות | הקצאה | ללא ספק | הקצאה ידנית

000020000672 הזמנה

חומר	טקסט קצר	קב. רכש	קב. חומר
דרישה	כמות נדרשת	יח. תאריך	אספקה דורש
ס מ ש	סוג א פ ח	כמות מוזמנת	יח. תאריך שחרור מספר מעקב
9918	01	ת	3000
התקנת 2 ניקודות תקשורת במטבח, קומה 6			
00010	1600000155	12.02.2004	0 AU
12.02.2004			
0000100533	F D 2NB6 T F N	0000100533	0000100533
ספק קבוע בוקל תקשורת בע"מ איגון רכש 3000			
100617	100617	100617	100617
ספק מבוקש פי בוק צילום 1999 בע"מ			

000020000744 הזמנה

חומר	טקסט קצר	קב. רכש	קב. חומר
דרישה	כמות נדרשת	יח. תאריך	אספקה דורש
ס מ ש	סוג א פ ח	כמות מוזמנת	יח. תאריך שחרור מספר מעקב
9915	05	נ	3000
התקנת מזגנים-פישבן-חדר עיון-שלומי שליו			
00010	1600000168	17.02.2004	0 AU
24.02.2004			
0000100081	F D 2NB6 T F N	0000100081	0000100081
ספק קבוע שליו מיזוג אויר איגון רכש 3000			
100081	100081	100081	100081
ספק מבוקש שליו מיזוג אויר			

000020000847 הזמנה

חומר	טקסט קצר	קב. רכש	קב. חומר
דרישה	כמות נדרשת	יח. תאריך	אספקה דורש
ס מ ש	סוג א פ ח	כמות מוזמנת	יח. תאריך שחרור מספר מעקב

INS tdsapqa ME5J

ממסך זה ניתן לבצע תהליך drill down לתוך דרישות הרכש על ידי לחיצה כפולה על השורה המבוקשת.

שיים ♥ -

ישנם שלושה דוחות נוספים הדומים לדוח הנ"ל ומציגים:

- דרישות רכש מוקצות עבור הקצאת חשבון (עבור אלמנט WBS) בטרנזקציה – ME5K
- הזמנות רכש מוקצות עבור פרויקט בטרנזקציה – ME2J
- הזמנות רכש מוקצות עבור הקצאת חשבון (עבור אלמנט WBS) בטרנזקציה – ME2K



**2.8 תקציב/בפועל/התחייבות/תוכנית נשאר/הוקצה בשקלים (טרנזקציה zpm\_ils\_budget)**

**1. הכנס (דרך חלונית הטרנזקציות) לטרנזקציה zpm\_ils\_budget:**

יתקבל החלון הבא:

**2. התייחס לשדות הבאים:**

הסבר	סטטוס	שדה
הזן / בחר מתוך רשימת חיפוש	חובה	פרויקט
הזן / בחר מתוך רשימת חיפוש את הגרסה הרצויה	רשות	גרסת תכנון
סמן – "דוח גרפי – פלט"	רשות	סוג פלט



3. להפקת הדוח הקש F8 או לחץ על

יתקבל המסך הבא:

**ביצוע ILS-תקציב/בפועל/התחייבות/תכנון נות/הוקצה: סקירה**

פורמט מספרים...

נתונים נוכחיים 04.03.2004

ILS-תקציב/בפועל/התחייבות/תכנון נות/הוקצה

ערכים כוללים							אובייקט מוצג ב-
תכנון ILS 1	זמין ILS 1	מוקצה ILS 1	תכ.הזמ.נות ILS 1	התחייבות ILS 1	בפועל ILS 1	תקציב ILS 1	
0	20,562-	20,562	0	18,748	1,814	0	פר. T. 2004
0	20,562-	20,562	0	18,748	1,814	0	WBS T. 2004
0	1,279-	1,279	0	1,279	0	0	WBS T. 2004. 2010
0	1,279-	1,279	0	1,279	0	0	ORD 20000672
0	74-	74	0	0	74	0	WBS T. 2004. 2020
0	74-	74	0	0	74	0	ORD 20000885
0	11,628-	11,628	0	9,888	1,740	0	WBS T. 2004. 2050
0	5,216-	5,216	0	5,216	0	0	ORD 20000744
0	311-	311	0	0	311	0	ORD 20000844
0	3,776-	3,776	0	3,776	0	0	ORD 20000888
0	897-	897	0	897	0	0	ORD 20000908
0	1,429-	1,429	0	0	1,429	0	ORD 20000953
0	2,010-	2,010	0	2,010	0	0	WBS T. 2004. 2100
0	2,010-	2,010	0	2,010	0	0	ORD 20000682
0	4,956-	4,956	0	4,956	0	0	WBS T. 2004. 2130
0	4,956-	4,956	0	4,956	0	0	ORD 20000708
0	615-	615	0	615	0	0	WBS T. 2004. 2320
0	615-	615	0	615	0	0	ORD 20000847
0	20,562-	20,562	0	18,748	1,814	0	תוצאה

INS tdsapap2 ZPM\_ILS\_BUDGET

בדוח זה ניתן לראות את:

- נתונים כמו בדו"ח הדולרי של: תקציב/בפועל/התחייבות/תוכנית נשאר/הוקצה

**2.9** תכנון/בפועל/התחייבות/תוכנית נשאר/הוקצה בשקלים (טרנזקציה zpm\_ils\_plan)

1. הכנס (דרך חלונית הטרנזקציות) לטרנזקציה zpm\_ils\_plan :

יתקבל החלון הבא:

The screenshot shows the SAP transaction ZPM\_ILS\_PLAN. The main area displays a table with columns for 'עד' (To) and 'מ' (From) for various planning levels. The table is currently empty. The top right shows the project ID 'T.2004' and the user 'פרויקט'. The bottom right shows the 'סוג פלט' (Output Type) set to 'דיווח לפי רמות קלאסי' (Classic Hierarchy Report).

2. התייחס לשדות הבאים:

שדה	סטטוס	הסבר
פרויקט	חובה	הזן / בחר מתוך רשימת חיפוש
גרסת תכנון	רשות	הזן / בחר מתוך רשימת חיפוש את הגרסה הרצויה
סוג פלט	רשות	סמן – "דוח גרפי – פלט"



3. להפקת הדוח הקש F8 או לחץ על

יתקבל המסך הבא:

**ביצוע ILS-תכנון/בפועל/התחייבות/תכנון נות/הוקצה: סקירה**

פורמט מספרים...

נתונים נוכחיים 2004.03.04 Z

ILS-תכנון/בפועל/התחייבות/תכנון נות/הוקצה

ערכים כוללים							או בייקט מוצג ב-
תקציב ILS 1	זמין ILS 1	מוקצה ILS 1	תכ.הזמ.נות ILS 1	התחייבות ILS 1	בפועל ILS 1	תכנון ILS 1	
0	20,562-	20,562	0	18,748	1,814	0	פר. T.2004
0	20,562-	20,562	0	18,748	1,814	0	WBS T.2004
0	1,279-	1,279	0	1,279	0	0	WBS T.2004.2010
0	1,279-	1,279	0	1,279	0	0	ORD 20000672
0	74-	74	0	0	74	0	התקנת 2 ניקודות תקשור
0	74-	74	0	0	74	0	WBS T.2004.2020
0	11,628-	11,628	0	9,888	1,740	0	ORD 20000885
0	5,216-	5,216	0	5,216	0	0	הכנת תשתית הזנה לגלא
0	311-	311	0	0	311	0	WBS T.2004.2050
0	3,776-	3,776	0	3,776	0	0	ORD 20000744
0	897-	897	0	897	0	0	התקנת מזגנים
0	1,429-	1,429	0	0	1,429	0	ORD 20000844
0	2,010-	2,010	0	2,010	0	0	תיקון מערכת חשמל
0	2,010-	2,010	0	2,010	0	0	לוח מחיק
0	4,956-	4,956	0	4,956	0	0	ORD 20000888
0	615-	615	0	615	0	0	וילונות שחורים
0	615-	615	0	615	0	0	ORD 20000908
0	2,010-	2,010	0	2,010	0	0	תשתית חשמל
0	4,956-	4,956	0	4,956	0	0	ORD 20000953
0	615-	615	0	615	0	0	WBS T.2004.2100
0	615-	615	0	615	0	0	ORD 20000682
0	20,562-	20,562	0	18,748	1,814	0	התקנת 2 נק' תקשורת ב
0	20,562-	20,562	0	18,748	1,814	0	WBS T.2004.2130
0	20,562-	20,562	0	18,748	1,814	0	ORD 20000708
0	20,562-	20,562	0	18,748	1,814	0	מתקן לאיסוסו כבלים
0	20,562-	20,562	0	18,748	1,814	0	WBS T.2004.2320
0	20,562-	20,562	0	18,748	1,814	0	ORD 20000847
0	20,562-	20,562	0	18,748	1,814	0	התקנת נקודת תקשורת א
0	20,562-	20,562	0	18,748	1,814	0	תוצאה

INVS tdsapap2 ZPM\_ILS\_PLAN

בדוח זה ניתן לראות את:

- נתונים כמו בדו"ח הדולרי של: תכנון/בפועל/התחייבות/תוכנית נשאר/הוקצה

**2.10 תקציב / משוחרר / התחייבויות / בפועל – בשקלים (טרנזקציה zpm\_ils\_rel\_bdgt)**

4. הכנס (דרך חלונית הטרנזקציות) לטרנזקציה zpm\_ils\_rel\_bdgt:

יתקבל החלון הבא:

The screenshot shows the SAP transaction ZILS12KST1A1. The main area displays a table with columns for 'עד' (To) and 'ממ' (From) for various budget items. The 'פרוייקט' (Project) field is set to 'T. 2004'. Below the table, there are fields for 'גירסת תכנון' (Planning Version) set to '0' and 'גירסה פעילה' (Active Version). At the bottom right, there are radio buttons for 'ד"ח גרפי-פלט' (Graphical Print) and 'דיווח לפי רמות קלאסי' (Classical Hierarchy Report), with the latter selected.

5. התייחס לשדות הבאים:

הסבר	סטטוס	שדה
הזן / בחר מתוך רשימת חיפוש	חובה	פרוייקט
הזן / בחר מתוך רשימת חיפוש את הגרסה הרצויה	רשות	גרסת תכנון
סמן – "דוח לפי רמות קלאסי"	רשות	סוג פלט



6. להפקת הדוח הקש F8 או לחץ על

יתקבל המסך הבא:

ביצוע ZILS12KST1A1 סקירה

פורמט מספרים...

נתונים נוכחיים 29.03.2004

ערכים כוללים							אובייקט מוצג ב-
זמין ILS 1	מוקצה ILS 1	תכ.חזמנות ILS 1	התחייבות ILS 1	בפועל ILS 1	תק. משוחרר ILS 1	תקציב שוטף ILS 1	
19,133-	19,133	0	18,748	384	0	0	פר. T. 2004
19,133-	19,133	0	18,748	384	0	0	WBS T. 2004
1,279-	1,279	0	1,279	0	0	0	WBS T. 2004.2010
1,279-	1,279	0	1,279	0	0	0	ORD 20000672
74-	74	0	0	74	0	0	WBS T. 2004.2020
74-	74	0	0	74	0	0	ORD 20000885
10,199-	10,199	0	9,888	311	0	0	WBS T. 2004.2050
5,216-	5,216	0	5,216	0	0	0	ORD 20000744
311-	311	0	0	311	0	0	ORD 20000844
3,776-	3,776	0	3,776	0	0	0	ORD 20000888
897-	897	0	897	0	0	0	ORD 20000908
0	0	0	0	0	0	0	ORD 20000953
2,010-	2,010	0	2,010	0	0	0	WBS T. 2004.2100
2,010-	2,010	0	2,010	0	0	0	ORD 20000682
4,956-	4,956	0	4,956	0	0	0	WBS T. 2004.2130
4,956-	4,956	0	4,956	0	0	0	ORD 20000708
615-	615	0	615	0	0	0	WBS T. 2004.2320
615-	615	0	615	0	0	0	ORD 20000847
19,133-	19,133	0	18,748	384	0	0	תוצאה

INS tdsapqa ZPM\_ILS\_REL\_BDGT

בדוח ניתן לראות את:

- התקציב השוטף
- התקציב המשוחרר
- עלויות בפועל (הזמנות רכש, חומרים ושירותים שדווח בהם קבלה, ניפוקי חומר מהמחסן).
- התחייבויות (דרישות והזמנות רכש פתוחות)
- תכנון הזמנות (מכיל תכנון שעות עבודה בתעריף שעה, ותכנון דרישות רכש שלא נוצרו)
- התקציב המוקצה (בפועל + התחייבויות + תכנון הזמנות)
- התקציב הזמין (תקציב – מוקצה)
